

Application mobile de recommandation vestimentaire par intelligence artificielle

Tout le projet en 4 points :

Projet

Application mobile qui recommande des vêtements à partir des photos des clients et de leurs préférences.
Hébergement via Microsoft Azure

Chiffres

Investissement 315 415 €. Coûts récurrents 103 562 €/an. Rentabilité année 2. Flux cumulé +1,35 M€ à 5 ans.

Calendrier

9 sprints de 2 semaines, 18 semaines au total. MVP livré semaine 10. V1 complète semaine 18.

Vigilances

Photos = données personnelles. AIPD obligatoire. Biais du modèle surveillés. Conformité RGPD et AI Act.

Pourquoi maintenant

Marché

Les achats mode basculent vers le mobile.

Concurrence

Un concurrent prépare la même application.

Adoption

Nos clients fidèles utilisent déjà leur téléphone pour s'inspirer avant d'acheter.

Le produit

Deux approches de recommandation

Recommandation par photos

L'utilisateur prend une photo.
Le modèle analyse les vêtements visibles : forme, couleur, motif.

Pas de reconnaissance faciale.

Recommandation par préférences

L'utilisateur déclare ses styles et marques préférés.
Le modèle propose des articles correspondants.

Disponible aussi pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas partager de photos.

Évaluation du succès

4 indicateurs suivis

+ 20 %

**Chiffre d'affaires
additionnel**

À 24 mois

30 %

Taux d'adoption

Sur la base clients fidèles

4 / 5

Satisfaction utilisateur

Note dans les stores


< 2 s

Temps de réponse

Latence d'une recommandation

Rentabilité atteinte année 2

Coûts cumulés et gains cumulés sur 5 ans

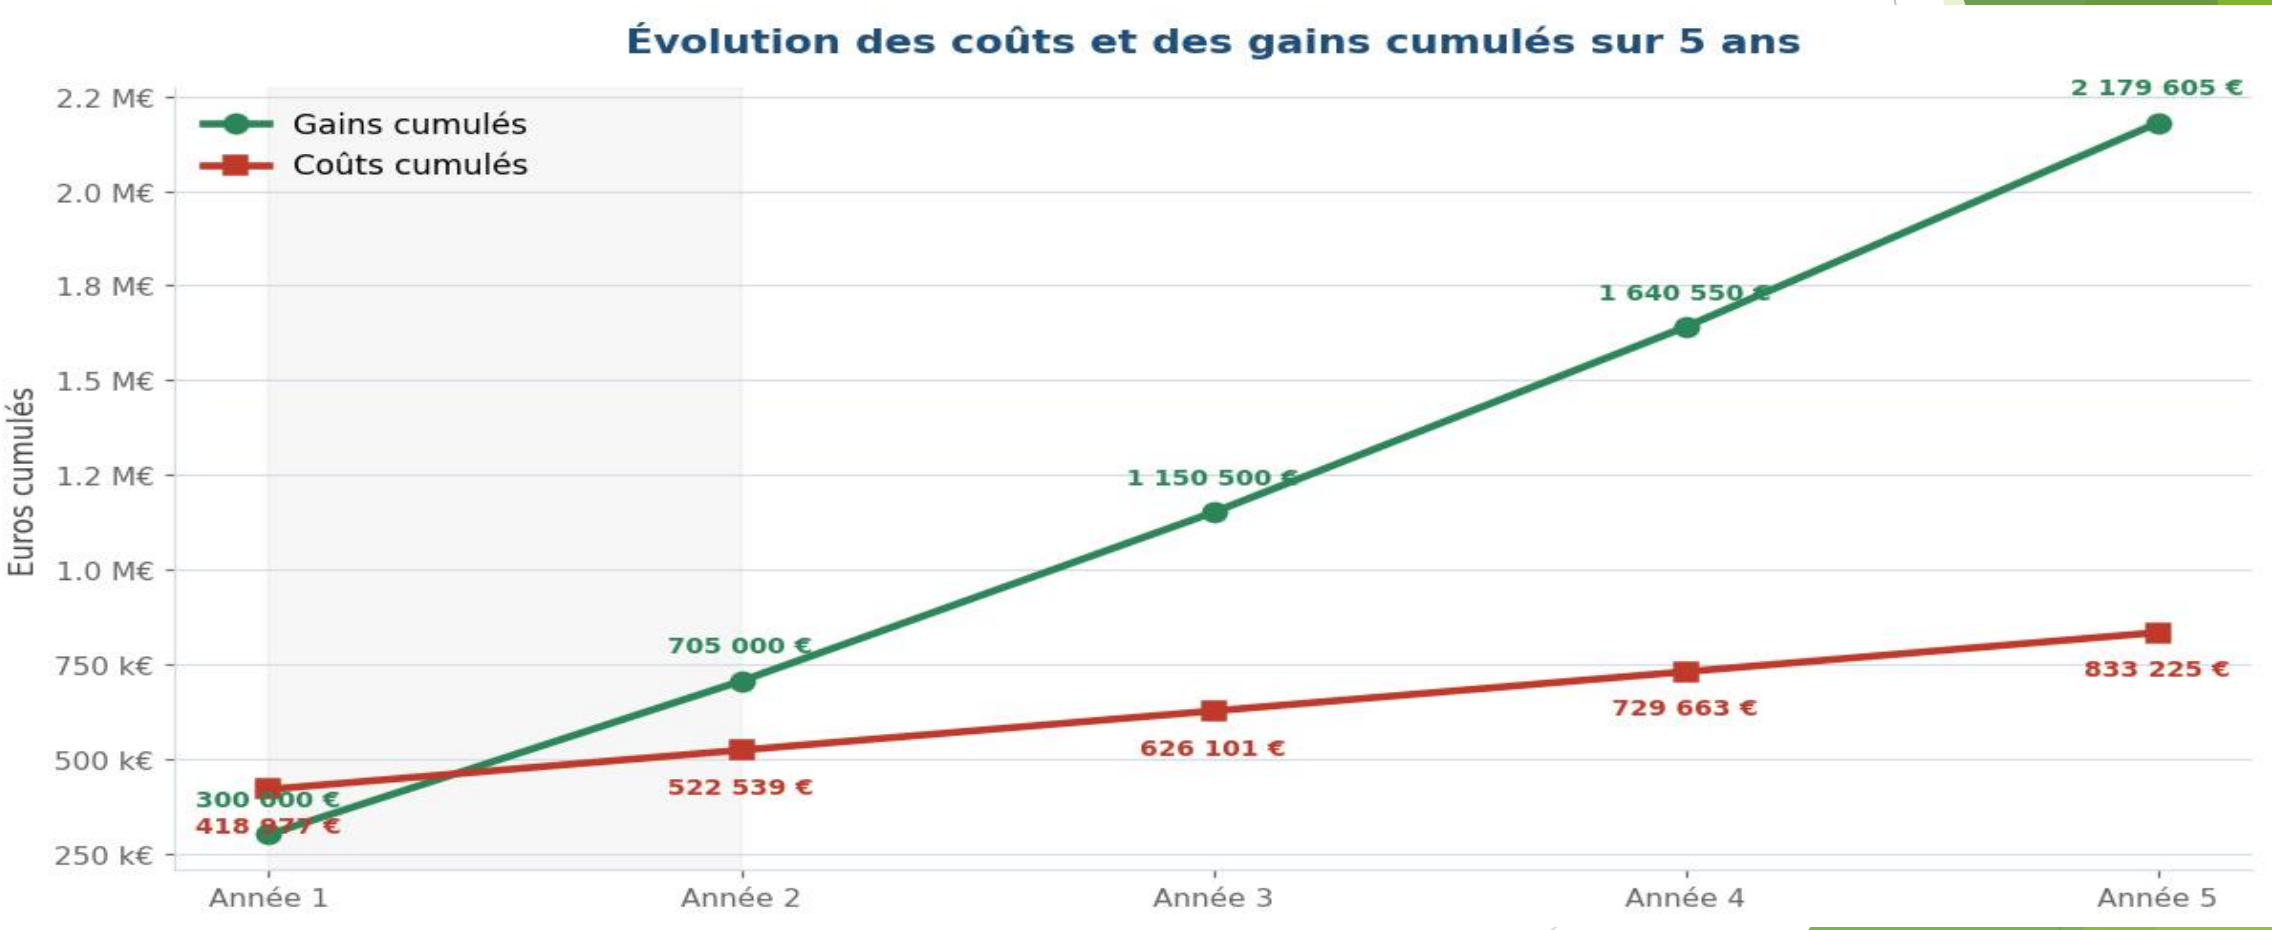

Ressources humaines

10 profils

Pilotage

Product Owner

Vision produit, priorisation, décisions

Scrum Master

Animation, déblocage, suivi

Production

Data Scientist

Modèles de recommandation

ML Engineer

Industrialisation des modèles

Architecte cloud Azure

Architecture technique

Développeur mobile

Application iOS et Android

Ingénieur DevOps

CI/CD, supervision

Designer UX

Parcours et écrans

Conformité et qualité

Testeur QA

Tests de recette


Délégué à la protection des données

RGPD, AIPD

Ressources techniques

Architecture de l'application mobile Fashion-Insta

Hébergement Microsoft Azure - Régions Union européenne uniquement (France Centre / West Europe)

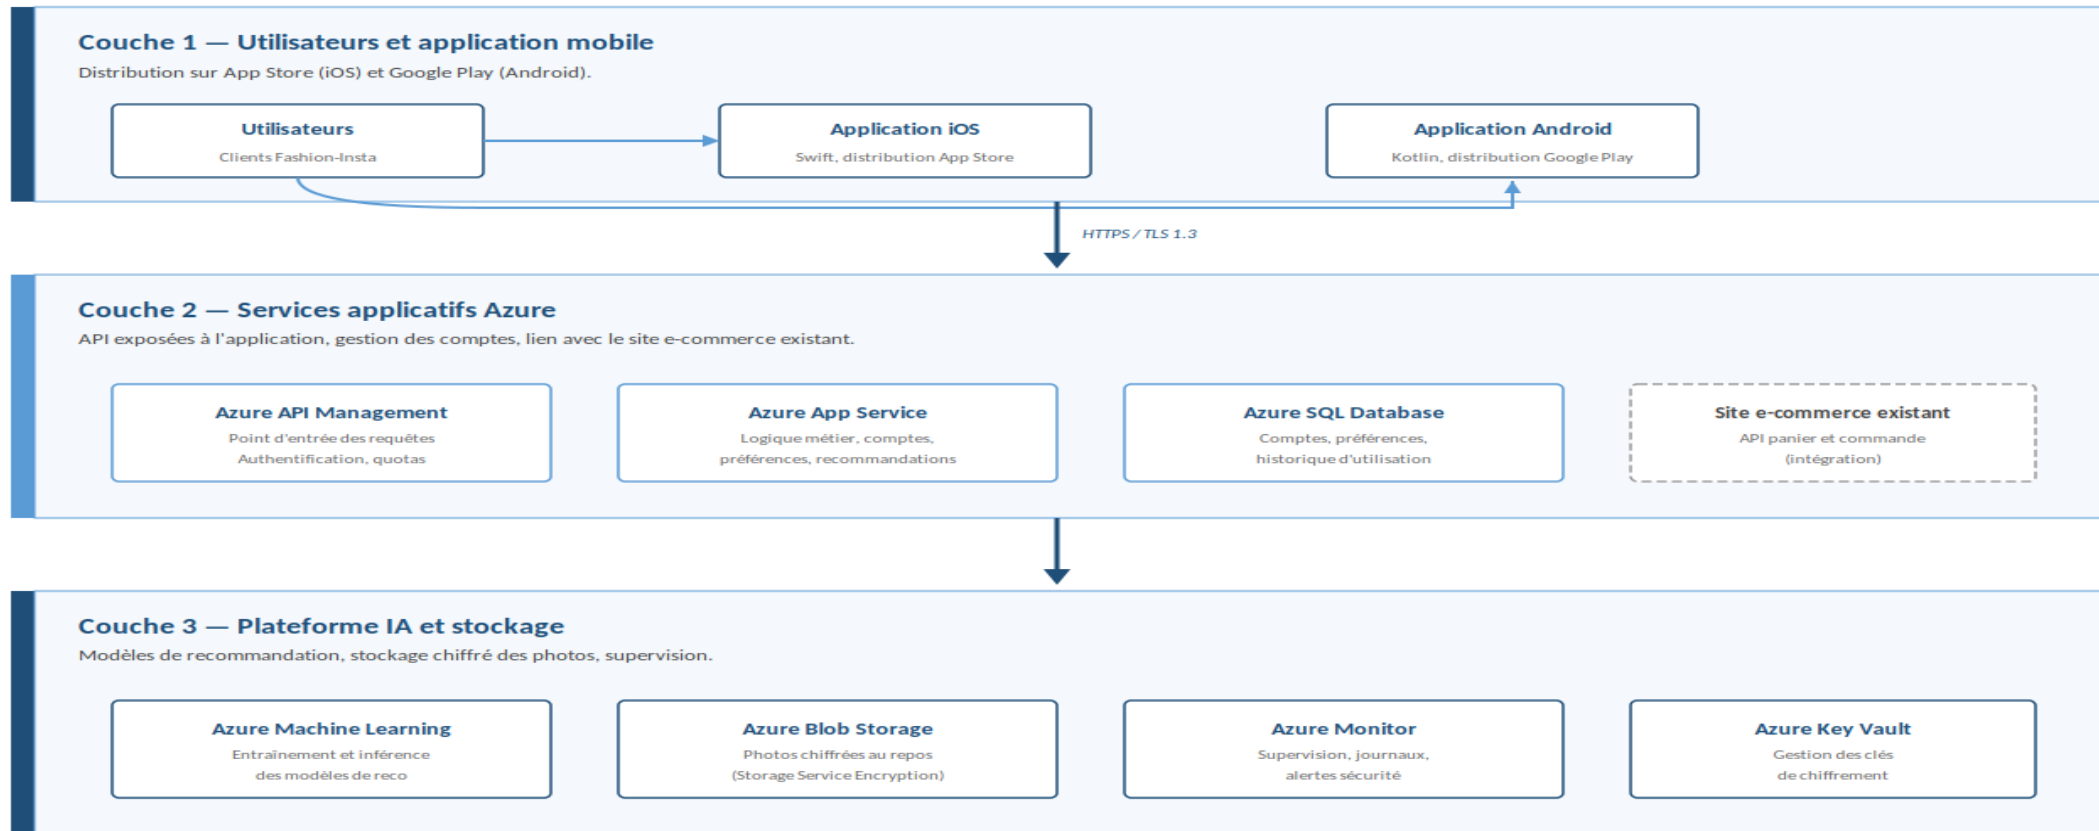

Ressources financières

Investissement initial et coûts récurrents

Investissement initial

315 415 €

Versement unique au démarrage

Équipe projet — 290 415 €

Azure entraînement et dev — 25 000 €

Coûts récurrents annuels

103 562 €

Par an, à partir de la mise en production

Maintenance — 43 562 € (15 % du dev)

Azure production — 60 000 €

Méthode SCRUM

Livrer toutes les 2 semaines, ajuster en continu

1

Livrer vite

Un incrément utilisable toutes les 2 semaines

2

S'adapter

Le backlog se réorganise à chaque sprint

3

Décider ensemble

PO, équipe et utilisateurs pilotes en revue de sprint

Le rythme d'un sprint

Sprint de 2 semaines, 10 jours ouvrés

J1

Sprint planning

L'équipe et la PO choisissent les fonctionnalités du sprint.

Tous les matins

Daily scrum

15 minutes debout. Ce que j'ai fait, ce que je fais, ce qui me bloque.

J10

Sprint review

Démonstration des fonctionnalités livrées à la PO et aux parties prenantes.


J10

Rétrospective

Équipe seule, sans la PO. Ce qui a marché, ce qu'on améliore.

Suivi quotidien : le burndown chart

Charge restante du sprint, mise à jour chaque jour

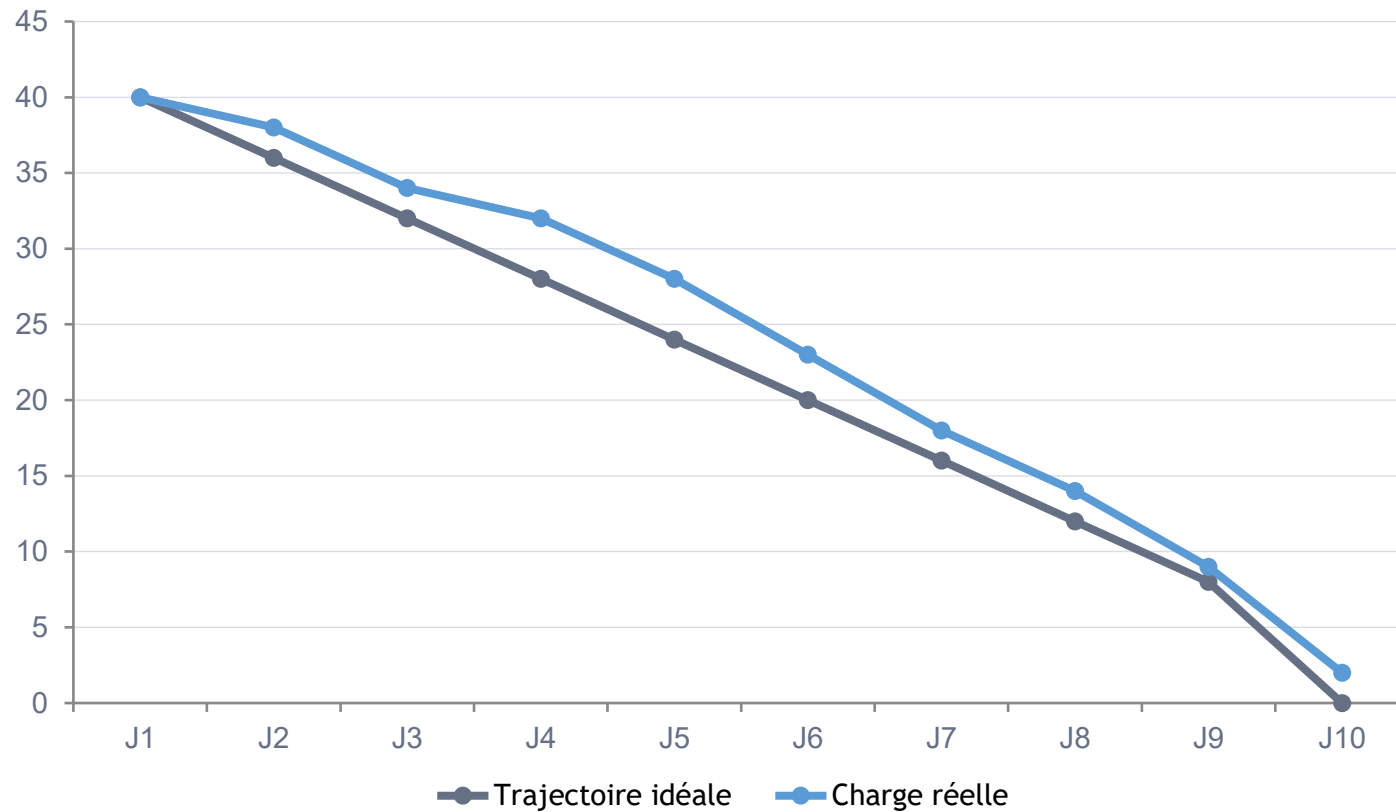

Lecture

- Vertical : charge restante (jours-homme)
- Horizontal : jours du sprint
- Ligne grise : trajectoire idéale
- Ligne bleue : trajectoire réelle
- Au-dessus du gris : retard
- En dessous : avance

Backlog

16 user stories, MVP identifié

#	Titre	MoSCoW	MVP	Charge
1	Inscription et connexion	Must	Oui	8
2	Prise de photo dans l'application	Must	Oui	10
3	Gestion de la collection de photos	Must	Oui	12
4	Recommandation à partir de ma garde-robe	Must	Oui	70
5	Sélection des styles préférés	Must	Oui	5
6	Sélection des marques préférées	Should	Non	5
7	Sources d'inspiration externes	Could	Non	12
8	Recommandation à partir de mes préférences	Must	Oui	35
9	Affichage du vêtement sur ma photo	Should	Non	45
10	Changement de couleur du vêtement	Could	Non	20
11	Changement de style du vêtement	Could	Non	20
12	Avis sur les recommandations	Should	Non	8
13	Achat d'un article recommandé	Should	Non	10
14	Consentement à la collecte des photos	Must	Oui	8
15	Accès et suppression données personnelles	Must	Oui	12
16	Purge automatique en cas d'inactivité	Should	Non	10

Planning des 9 sprints

18 semaines, MVP livré en semaine 10

Sprint	Semaines	Thème	Livrables	Charge
S1	S1-2	Socle technique et RGPD	Connexion, styles, consentement	21 j
S2	S3-4	Collecte et droits	Photo, garde-robe, droits RGPD	34 j
S3	S5-6	Recommandation préférences	Premier moteur livré	35 j
S4	S7-8	Recommandation photos 1/2	Démarrage moteur visuel	35 j
S5	S9-10	MVP livré	Fin moteur visuel + marques	40 j
S6	S11-12	Mise en service	Achat, avis, purge automatique	28 j
S7	S13-14	Affichage virtuel 1/2	Vêtement sur la photo	25 j
S8	S15-16	Affichage virtuel 2/2	Finition + variantes couleur	40 j
S9	S17-18	V1 complète	Style + sources d'inspiration	32 j
Total				290 j

Cadre légal

RGPD et AI Act intégrés dès la conception

RGPD — Règlement UE 2016/679

- Consentement explicite avant collecte des photos
- Droits d'accès, de rectification et de suppression
- Minimisation des données collectées
- Hébergement Azure UE uniquement
- AIPD obligatoire pour les photos

AI Act — Règlement UE 2024/1689

- Système à risque limité
- Transparence : l'utilisateur sait qu'il utilise une IA
- Documentation technique du modèle
- Surveillance humaine des décisions
- Veille réglementaire continue

Traitement sensible : recommandation par photos

Finalité	Recommander des articles à partir des photos de l'utilisateur
Base légale	Consentement explicite (article 6.1.a du RGPD)
Données traitées	Photos, vecteurs (embeddings), préférences, données techniques
Durée de conservation	3 ans après dernière activité, ou suppression à la demande
Sous-traitant	Microsoft Azure (UE uniquement)
AIPD	Obligatoire : 3 critères CNIL remplis sur 9

Enjeux éthiques : biais du modèle

3 actions de prévention

01

Audit du dataset

Vérifier la représentativité du jeu d'entraînement : morphologies, genres, âges, couleurs de peau. Rééquilibrage si nécessaire.

02

Métriques par profil

Mesurer la performance du modèle séparément pour chaque segment d'utilisateur. Détecter les écarts.

03

Comité éthique

Validation interne par un comité éthique avant chaque mise en production. Signalement utilisateur dans l'application.

Analyse des risques

13 risques identifiés, méthode du spectre 7D

5

Critiques

criticité 5 à 6

7

À surveiller

criticité 3 à 4

1

Acceptable

criticité 0 à 2

0

Inacceptables

criticité 7 à 9

5 risques critiques et leur plan d'action

Criticité 5 à 6 sur 9

Réf.	Risque	Plan d'action
R3	Retard face au concurrent	MVP livré en 10 semaines, mise en marché progressive
R4	Indisponibilité des dev mobiles	Engagement formel sur la disponibilité, dev externe en repli
R5	Dépendance au sous-traitant IA	Pair programming et montée en compétence interne
R7	Biais du modèle	Audit dataset, métriques par profil, comité éthique
R9	Performance IA insuffisante	PoC en Sprint 1-2, bascule possible sur la recommandation par préférences

Décision de lancement pour le projet

315 415 €

Investissement initial

Année 2

Rentabilité atteinte

18 semaines

Livraison V1

Merci
